

**EVALUACIÓN DEL POA  
AÑO 2018**

**RESUMEN EJECUTIVO**

En el POA del año 2018 se registra un total de 33 proyectos. De los 12 proyectos de Fiscalización, 11 corresponden a arrastres, es decir iniciaron en periodos anteriores al año 2018 y aún se mantienen en el POA porque hay tareas pendientes para su cierre definitivo. En cuanto a los proyectos de Estudios o Diseños, del total de 21 proyectos, 12 se han generado en el transcurso 2018 y los 9 restantes son arrastres de periodos anteriores.

A continuación, se resume el estado de los proyectos:

	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
<b>FISCALIZACIONES</b>	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR	Empresa Pública del Agua -EPA EP-	\$ 9.167.872,95	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.						
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL	Empresa Pública del Agua -EPA EP-	\$ 5.401.421,75	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.						
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU	Empresa Pública del Agua -EPA EP-	\$ 768.885,07	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.						
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO - PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO (1)	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	\$ 1.172.398,41	EN LIQUIDACIÓN						
	FISCALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE GUANGARCUCHO	ETAPA EP	\$ 213.392,20	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA.						
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 644.002,38	LIQUIDADO						

	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 174.130,79	SUSPENDIDO (SOLICITADA TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO)						
	FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO - LIMON, TRAMO: GUALACEO-PLAN DE MILAGRO, CON 60.77 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO; Y, DISEÑOS DEFINITIVOS E INGENIERÍA DE DETALLE (2)	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	\$ 4.247.269,07	EN EJECUCIÓN						
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY	Universidad de Cuenca	\$ 158.783,61	CONCLUIDO (pendiente de liquidar)						
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY	Universidad de Cuenca	\$ 156.990,74	CONCLUIDO (pendiente de liquidar)						
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VÍAS DESDE LA DERIVACIÓN DE LA VÍA GIRÓN - PASAJE, VÍA PUENTE - UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RÍO JUBONES Y ESCOMBRERA	ELECAUSTRO S.A.	\$ 337.554,37	LIQUIDADO						
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA PARA LA FASE DOS, CON FINANCIAMIENTO	ELECAUSTRO S.A.	\$ 1.875.073,67	EN EJECUCIÓN						
ESTUDIOS	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO y DE INVESTIGACIÓN "BALZAY"	Universidad de Cuenca	\$ 919.006,52	SUSPENDIDO						
	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS "IRQUIS"	Universidad de Cuenca	\$ 437.086,33	SUSPENDIDO						
	ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN, READECUACIÓN E INTERVENCIÓN PREDIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PASAJE ARTESANAL Y COMERCIAL SAN FRANCISCO	GAD Municipal del Cantón Cuenca	\$ 174.930,00	EN EJECUCIÓN						

	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ	GAD Municipal del cantón Portoviejo	\$ 1.591.021,17	CONCLUIDO						
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITUD TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTO-	\$ 1.287.800,00	CONCLUIDO						
	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS Y LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE CARGOS POR COMPETENCIAS Y VALORACIÓN DE CARGOS DE EMAPAL EP	Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del Cantón Azogues -EMAPAL EP-	\$ 17.652,80	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.						
	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL EMURPLAG EP - CUENCA	Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado -EMURPLAG EP-	\$ 163.000,00	CONCLUIDO (Pendiente liquidación)						
	VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL TRAMO BIBLIÁN - ZHUD DE LA VÍA E35 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, REALIZADO POR EL ECUATEST EN EL AÑO 2014, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ENSAYOS IN SITU Y EN LABORATORIO, Y DETERMINACIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO PREMATURO DEL PAVIMENTO	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTO- Dirección Distrital del Cañar	\$ 86.650,00	CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.						

	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	ESTUDIOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL COLEGIO NACIONAL "BENIGNO MALO" Y DISEÑO DE EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS	Coordinación de Educación Zonal 6	\$ 300.000,00	EN EJECUCIÓN						
	EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCOPE PARA EL PERIODO 2013-2017 Y SU IMPACTO	Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda.	\$ 15.559,36	CONCLUIDO. CON ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN						
	ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO	GAD Municipal de Zaruma	\$ 148.239,28	EN EJECUCIÓN						
	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS Y LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE CARGOS POR COMPETENCIAS Y VALORACIÓN DE CARGOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL -EMAPAT EP	Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de La Troncal -EMAPAT EP-	\$ 15.047,37	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.						
	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EL EDIFICIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.	Empresa Eléctrica Azogues C.A.	\$ 27.668,57	CONCLUIDO. CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.						

	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA: PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUENCA - ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE 14 KM DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTO-	\$ 2.586.696,00	EN EJECUCIÓN						
	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES - BIBLIÁN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTO-	\$ 1.512.664,45	EN EJECUCIÓN						
	ELABORACIÓN DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA PARA LA RESIDENCIA DE LA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 27.559,32	EN EJECUCIÓN						
	DISEÑO DEL SISTEMA DE SEÑALÉTICA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 6.508,72	SUSPENDIDO						
	ESTUDIO DE CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL RECURSO COMPLEMENTARIO EÓLICO	Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador -CELEC EP-	\$ 145.870,00	EN EJECUCIÓN						

	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO	CONCLUIDO	LIQUIDADO	EN LIQUIDACIÓN	POR LIQUIDAR	EN EJECUCIÓN	SUSPENDIDO
	ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO AL PUENTE COPUENO Y DE OTROS SITIOS CRÍTICOS SELECCIONADOS EN LA VÍA E45 -TRONCAL AMAZÓNICA-, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	\$ 258.782,00	SUSPENDIDO						
	ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REMODELACIÓN DE LA IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	\$ 18.807,45	EN EJECUCIÓN						
	ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE, A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y HUELLA DE CARBONO GENERADA POR DESPLAZAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE CUENCA	GIZ - Cooperación Técnica Alemana	\$ 44.624,14	EN EJECUCIÓN						
			<b>\$ 34.102.948,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>5</b>
					<b>36%</b>	<b>6%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>36%</b>	<b>15%</b>

Se han llevado a cabo seguimientos mensuales, a través de los cuales se han definido planes de acción para superar retrasos o inconvenientes presentados en los diferentes proyectos, estableciéndose responsables y fechas de cumplimiento; estos planes de acción son evaluados al mes siguiente de su definición.


## CLIENTES

Desde su creación hasta diciembre del año 2018 la Empresa ha establecido relaciones de trabajo con un total de 20<sup>1</sup> clientes, con los que ha llevado a cabo 39 proyectos, por un monto total de US\$ 34'882.672,93:

<sup>1</sup> Cinco clientes adicionales a los que sumaba el año 2017.

CLIENTES		Fiscalizaciones	Estudios	No. De Proyectos
1	EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA -EPA EP-	3		3
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -MTOP-	2	5	7
3	ETAPA EP	1		1
4	UNIVERSIDAD DE CUENCA	4	5	9
5	ELECAUSTRO S.A.	2		2
6	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA		2	2
7	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-		1	1
8	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA -EMAC EP-		1	1
9	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO		1	1
10	CELEC EP		2	2
11	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA -EMOV EP-		1	1
12	ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES "ONU MUJERES"		1	1
13	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ACLANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN AZOGUES		1	1
14	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL		1	1
15	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO -EMURPLAG EP-		1	1
16	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONAL 6		1	1
17	GAD MUNICIPAL DE ZARUMA		1	1

CLIENTES		Fiscalizaciones	Estudios	No. De Proyectos
18	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO		1	1
19	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.		1	1
20	GIZ – COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA		1	1
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>27</b>	<b>39</b>

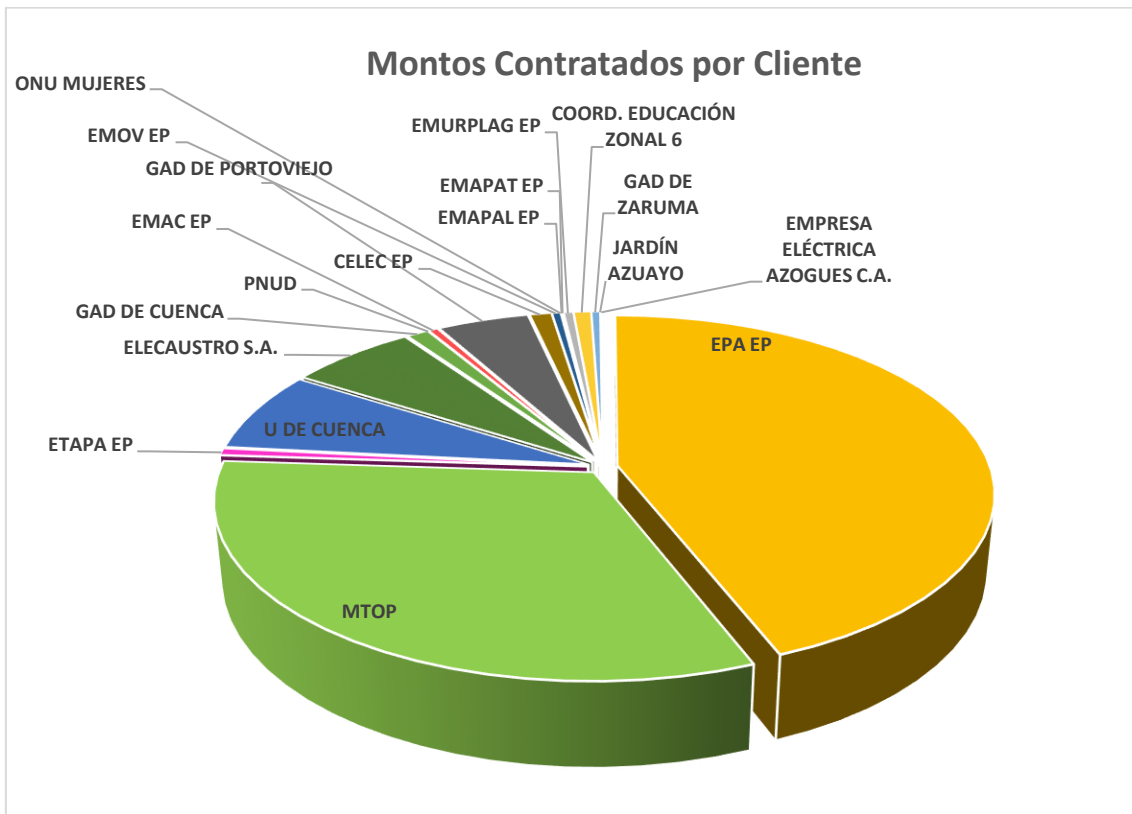

A continuación, se presenta el detalle de los eventos más relevantes de cada proyecto, su estado y las acciones a tomar.

**FISCALIZACIONES:**

**1. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO CAÑAR**

Este contrato fue suscrito con la SENAGUA el 12 de diciembre de 2012 por un monto de \$ 9'167.872,95. Se ejecutó en Consorcio constituido por UCUENCA EP, ACSAM Consultores Cía. Ltda. y Consultoría Técnica Cía. Ltda., del cual el



Ing. Rubén Jerves actuó como Procurador Común y actualmente el Procurador es el Ing. Cristóbal Gorki Albuja Castro.

El Acta de Recepción Definitiva ha sido suscrita con fecha 30 de junio de 2017. En el numeral décimo segundo se ha hecho constar la inconformidad con la deducción de los componentes de los Costos Indirectos del Contrato, que ascienden a una suma de US\$ 1'603.406,63, lo que se llevó a cabo en función de los resultados del examen aplicado al Proyecto de Naranjal.

Se presentó un reclamo administrativo dirigido al Gerente General de la EPA EP, para que se reconozcan los pagos pendientes por un monto de US\$ 212.027,06, por la ejecución de tareas adicionales a las contractuales, de la cual no se ha tenido respuesta. Se ha solicitado una mediación a la EPA EP, para agotar esta instancia y proceder a demandar. Se ha pasado el primer señalamiento de mediación en la Procuraduría General del Estado, sin que la EPA EP se haya presentado a esta diligencia. El segundo señalamiento se convocó para el 26 de octubre por parte de la Procuraduría General del Estado, sin tener la presencia de la EPA EP, por lo que se suspendió y se llevó a cabo una mediación virtual el viernes 18 de febrero, en la que ya se contó con la participación de la EPA EP y se acordó elaborar un acuerdo parcial, pero para su suscripción es necesario la emisión de una certificación presupuestaria por parte de la EPA EP, la que sería entregada en una nueva sesión de mediación fijada para el miércoles 27 de febrero.

Al momento, se ha concluido la etapa de mediación, sin que se haya podido llegar a un acuerdo con la contratante. Se presentará ante el Tribunal Contencioso Administrativo, la correspondiente demanda, para el pago de los valores adeudados.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- Acudir a segundo señalamiento de mediación.

## **2. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO NARANJAL**

Este contrato se suscribió con SENAGUA el 12 de diciembre de 2012, por un monto de \$ 5'401.421,75. Se ejecutó en Consorcio constituido por UCUENCA EP, ACSAM Consultores Cía. Ltda. y Consultoría Técnica Cía. Ltda., del cual el Ing. Rubén Jerves actuó como Procurador Común y actualmente el Procurador es el Ing. Cristóbal Gorki Albuja Castro.

El Acta de Recepción Definitiva ha sido suscrita con fecha 10 de julio de 2017. En el numeral décimo segundo se ha hecho constar la inconformidad con la deducción de los componentes de los Costos Indirectos del Contrato, que ascienden a una suma de US\$ 920.917,10.

En un Examen Especial llevado a cabo por la Contraloría General del Estado, se han predeterminado valores a ser reintegrados por parte del Consorcio Naranjal a la EPA EP, por un monto de US\$ 345.157,85, por el reconocimiento de gastos generales como parte de los costos indirectos. Al no estar de acuerdo, con fecha 9 de enero de 2018, el Consorcio remitió una comunicación al Subcontralor General del Estado, para la reconsideración de la predeterminación de responsabilidad civil, orden de reintegro.

Con oficio 0145-DPR la CGE remite la predeterminación de responsabilidad civil culposa: orden de reintegro (por reajustes de precios). Con oficio No. CN-OTR-001-2018 se remitió por parte del Consorcio otra comunicación dirigida al Subcontralor General del Estado, solicitando la reconsideración de la Orden de Reintegro, ante la notificación de predeterminación de responsabilidad civil culposa, haciendo responsable subsidiario, no solidario, al Consorcio Naranjal de un monto de \$ 4'212.033,40 por concepto de un valor injustificado debido a que los reajustes de precios del contrato de construcción del Proyecto Control de Inundaciones Naranjal, a criterio del auditor, se encuentran mal calculados.

El reclamo se encuentra en fase de revisión administrativa de la Orden de Reintegro por parte de la Contraloría General del Estado. Es conveniente la demora, por cuanto se podrá, de manera eventual, demandar una caducidad de la resolución que emita la Contraloría.

Por disposición contractual, se convocará en los próximos días a la primera audiencia de mediación con la EPA EP, para resolver sobre los valores adeudados.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:** Dar seguimiento a la respuesta de la Contraloría General del Estado.

### 3. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL RÍO BULU BULU

Este contrato fue suscrito con la Empresa Pública del Agua –EPA EP- el 16 de diciembre de 2014, por un monto de US\$ 768.885,07. Se ejecutó en Consorcio constituido por UCUENCA EP y ACSAM Consultores Cía. Ltda., del cual el Ing. Rubén Jerves actuó como Procurador Común y actualmente el Procurador es el Ing. Jonny Albuja Castro.

El Acta de Entrega Recepción Definitiva del contrato fue suscrita el 29 de diciembre de 2016. En el numeral décimo segundo se ha hecho constar la inconformidad con la retención (descuento) de los valores correspondientes a Gastos Generales contemplados en el contrato, lo que se llevó a cabo en función de los resultados del examen aplicado al Proyecto de Naranjal.

Con oficio No. AG-EPA-009-2017 de fecha 20 de septiembre de 2017, se remitió a la EPA EP, una comunicación que hace referencia a la petición de pago del monto pendiente por la ejecución de tareas adicionales a las contractuales, de la cual no se ha tenido respuesta.

Se tomó la decisión de judicializar el reclamo por los valores pendientes de pago y una vez que se contó con la documentación certificada por parte de la EPA EP, el 15 de enero se presentó la demanda por un monto de US\$ 917.000 (incluye: gastos administrativos, valores pendientes de pago e intereses) y ha recaído en la sala única del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Cuenca.

De igual forma, la Procuraduría General del Estado ha sido citada y se espera que se efectivice la comisión designada a un Juez de lo Civil del cantón Samborondón, para que realice la citación a la entidad contratante EPA EP.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- Una vez calificada la demanda se procederá a citar a la parte accionada.

**4. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO – PLAN DE MILAGRO, DE 60.77 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO**

Este proyecto se suscribió con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 16 de diciembre de 2014, por un monto de US\$ 1'172.398,41. Se ejecutó en Consorcio constituido por UCUENCA EP y CONSULPROY, del cual el Ing. Gerardo Cordero Pérez actuó como Procurador Común.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha cancelado los valores de liquidación, se encuentra pendiente la suscripción del Acta de Recepción y la liquidación del reajuste de precios.

Se ha llevado a cabo un Examen Especial de Ingeniería y se ha emitido el Informe Definitivo por parte de la Contraloría General del Estado, en el que se ratifican las recomendaciones; por lo que se ha iniciado un proceso de desvanecimiento de los hallazgos, lo que está siendo llevado a cabo por parte del Dr. Paúl Cordero, quien ha sido designado por el Consorcio para la defensa que corresponde.

En función de los resultados finales sobre este Examen, será el MTOP la entidad que elabore de liquidación.

Se ha solicitado la recepción definitiva del contrato y se espera la resolución por parte del Ministerio.

**Estado:** En liquidación.

**Acciones a tomar:**

- Dar seguimiento al proceso para el desvanecimiento de los hallazgos constantes en el Informe Definitivo de la Contraloría General del Estado del Examen Especial de Ingeniería, lo que será llevado a cabo por parte del Dr. Paúl Cordero, quien ha sido designado por el Consorcio para la defensa que corresponde.
- Remitir una nueva comunicación al Ministerio de Transporte y Obras Públicas insistiendo en la solicitud de recepción del contrato.

**5. FISCALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE GUANGARCUCHO**

Este contrato se suscribió con ETAPA EP el 5 de mayo de 2016, por un monto de US\$ 213.392,20.

El proyecto se encuentra concluido y se ha suscrito el Acta de Recepción Definitiva el 6 de noviembre de 2018.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:**

- No aplica.

## 6. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Esta fiscalización fue suscrita el 22 de abril de 2014 con la Universidad de Cuenca, por un monto de US\$ 644.002,38. Para este proyecto se suscribieron tres contratos complementarios.

**Pago de planillas:** Durante el mes de enero se han realizado los pagos que se resumen a continuación:

- Contrato Principal:
  - Planilla N° 24, período abril 2016 correspondiente al Edificio para el Centro Científico, Tecnológico y de Investigación.
  - Planilla N° 22, período abril 2016 correspondiente al Aulario 1 del Edificio para el Centro Científico, Tecnológico y de Investigación.
- Primer Contrato Complementario:
  - Planilla N° 12 (liquidación), período abril 2016 correspondiente al Laboratorio de Microred.
- Segundo Contrato Complementario:
  - Planilla N° 7, liquidación correspondiente al Edificio para el Centro Científico, Tecnológico y de Investigación.
  - Planilla N° 7, liquidación correspondiente al Aulario 1 del Edificio para el Centro Científico, Tecnológico y de Investigación.
  - Planilla N° 2, liquidación correspondiente al Laboratorio de Microred.
- Tercer Contrato Complementario:
  - Planilla N° 3 (liquidación), período enero 2017 correspondiente al Edificio para el Centro Científico, Tecnológico y de Investigación.
  - Planilla N° 3 (liquidación), período enero 2017 correspondiente al Aulario 1 del Edificio para el Centro Científico, Tecnológico y de Investigación.

Para el pago de valores por los servicios de Fiscalización prestados por UCUENCA EP durante el período adicional al contractual, esto es del 26 de enero al 31 de agosto de 2017, fecha en la que terminó la obra, se ha suscrito un Convenio de Pago con la Universidad, con fecha 23 de mayo de 2018, por un monto de US\$ 96.394,98, el mismo que ha sido cancelado el 5 de octubre de 2018.

**Estado:** Obra Concluida.

**Acciones a tomar:**

- Realizar la liquidación del reajuste de precios.

## 7. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Este contrato se suscribió con la Universidad de Cuenca el 20 de octubre de 2014, por un monto de US\$ 174.130,79.

La obra del Edificio para el Hotel Escuela para la Universidad de Cuenca, se contempló ejecutar en dos fases, sin considerar el período entre la ejecución de dichas fases como imputable al plazo del contrato de Fiscalización. La primera fase de la Construcción (Reforzamiento Estructura Existente y Construcción de

Estructura del Nuevo Bloque) ha sido concluida y se ha suscrito el Acta de Recepción Provisional el 16 de mayo de 2016, estando al momento en trámite la liquidación definitiva del proyecto y la elaboración del acta de entrega recepción definitiva.

La segunda fase aún no ha sido contratada, por lo que el contrato de fiscalización se encuentra suspendido. Adicionalmente, se conoce extraoficialmente que la Universidad resolvió cambiar el destino y uso de la edificación, de Hotel Escuela a Residencia Universitaria, lo que implica el rediseño de la arquitectura del edificio y sus instalaciones, con el consecuente cambio en el objeto del contrato.

Por lo indicado, a través de comunicación No. UCUENCA EP-GG-2017-137 del 23 de mayo de 2017 se puso a consideración del señor Rector la solicitud de proceder con el trámite de dar por terminado, de mutuo acuerdo, el contrato suscrito con UCUENCA EP, trámite que ha sido remitido al Administrador del Contrato, quien se ha pronunciado indicando que la solicitud es procedente.

Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-186 de fecha 1 de junio de 2018, se remitió una nueva solicitud al señor Rector para la terminación de mutuo acuerdo del contrato.

Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-329 del 7 de septiembre de 2018, dirigido al Arq. Patricio Hidalgo se solicitó indicar el estado de situación sobre:

- Liquidación del Contrato de Obra: se requiere un pronunciamiento del contratante -Universidad- sobre el reclamo del contratista.
- Terminación de Mutuo Acuerdo del Contrato de Fiscalización de esta obra.

Por otra parte, con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-140 de fecha 25 de mayo de 2017, se remitió al Administrador del Contrato, Arq. Marcelo Vázquez, la planilla No. 12 de liquidación y reajuste de precios de la Primera Fase del Contrato de Consultoría, para la revisión, aprobación y trámite de pago correspondiente, sin que hasta el momento se tenga respuesta por parte del Administrador del Contrato y tampoco se ha dado el trámite de pago.

- Planilla 12 de Liquidación por \$ 22.396,19 y reajuste de precios por \$ 944,72.

Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-185 de fecha 1 de junio de 2018, se insistió al nuevo Administrador del Contrato, Arq. Patricio Hidalgo, la revisión, aprobación y trámite de pago de la planilla de liquidación y reajuste de precios.

Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-329 del 7 de septiembre de 2018, dirigido al Arq. Patricio Hidalgo se solicitó indicar el estado de situación sobre el trámite de pago de las planillas de liquidación y liquidación de reajustes del Contrato de Fiscalización.

Se encuentra pendiente el reajuste definitivo de la planilla de liquidación, que se hará en base a la fecha en que se cancele la planilla No. 12.

**Estado:** Suspendido (solicitada terminación de mutuo acuerdo)

**Acciones a tomar:**

- Insistir en lo expuesto en el oficio No. UCUENCA EP\_GG-2018-329 del 7 de septiembre de 2018, a través del cual se solicitó indicar el estado de situación sobre la liquidación del contrato de obra, el trámite de pago de

las planillas de liquidación y liquidación de reajustes del contrato de fiscalización y la solicitud de terminación de mutuo acuerdo.

**8. FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO – LIMÓN, TRAMO: GUALACEO – PLAN DE MILAGRO, CON 60.77 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO; Y, DISEÑOS DEFINITIVOS E INGENIERÍA DE DETALLE**

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 15 de diciembre de 2016, por un monto de \$ 4'247.269,07. Se ejecuta en Consorcio constituido por UCUENCA EP y CONSULPROY, bajo la denominación de GUAPLAN – Consorcio Gualaceo-Plan de Milagro, del cual el Ing. Gerardo Cordero Pérez actúa como Procurador Común.

Se ha cancelado hasta la planilla 20, que corresponde al mes de agosto de 2018; encontrándose pendiente de pago la planilla de liquidación del contrato principal y la planilla de liquidación del contrato complementario 1.

El contrato complementario No. 2 determinó como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2018 y se encuentra pendiente de liquidar.

Se ha suscrito un tercer contrato complementario por 321 días, teniendo como fecha de finalización del 17 de noviembre de 2019.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:** Dar seguimiento a la cancelación de los valores adeudados.

**9. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY**

Este contrato fue suscrito el 1 de diciembre de 2016 con la Universidad de Cuenca por un monto de US\$ 158.783,61.

Se ha pagado la planilla de liquidación del contrato principal y se ha cancelado las planillas 1 a la 4 del contrato complementario 1.

Se encuentra pendiente el pago de la planilla No. 5 que corresponde a la planilla de liquidación del contrato complementario 1.

El contrato complementario No. 2 se encuentra pendiente de liquidar.

Con fecha 21 de diciembre se solicitó la suscripción de un tercer contrato complementario para la fiscalización de esta obra, cuya ejecución está prevista hasta el 18 de enero, el mismo que aún no se concreta.

**Estado:** En Ejecución.

**Acciones a tomar:**

- Insistir en el pago de la planilla de liquidación del contrato complementario 1.
- Remitir las planillas del contrato complementario 2.
- Insistir en la solicitud de suscripción de un tercer contrato complementario, que cubra el tiempo de ejecución de la obra.

## **10. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AULARIO DE CIENCIAS BÁSICAS BALZAY**

Este contrato se suscribió con la Universidad de Cuenca el 1 de diciembre de 2016, por un monto de US\$ 156.990,74.

Se ha pagado la planilla de liquidación del contrato principal y se ha cancelado las planillas 1 a la 4 del contrato complementario 1.

Se encuentra pendiente el pago de la planilla No. 5 que corresponde a la planilla de liquidación del contrato complementario 1.

Se ha suscrito un segundo contrato complementario con fecha 31 de mayo, estableciendo como fecha de finalización del 30 de diciembre de 2018. Cabe indicar que la obra concluyó el 18 de octubre.

**Estado:** Concluido. Pendiente de liquidar.

### **Acciones a tomar:**

- Insistir en el pago de la planilla de liquidación del contrato complementario 1.
- Remitir las planillas del contrato complementario 2, que corresponden al periodo 21 de junio al 18 de octubre de 2019.

## **11. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VÍAS DESDE LA DERIVACIÓN DE LA VÍA GIRÓN – PASAJE, VÍA PUENTE – UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RÍO JUBONES Y ESCOMBRERA**

Este contrato fue suscrito con Elecaustro S.A. el 7 de diciembre de 2017, por un monto de US\$ 337.554,37.

Al momento la fiscalización ha sido concluida y el contrato se encuentra liquidado. Se espera que se suscriba el Acta de Recepción Definitiva del contrato de obra, para proceder a la suscripción del Acta de Recepción de la Fiscalización.

**Estado:** Concluido. Liquidado.

### **Acciones a tomar:**

- Dar seguimiento a la suscripción del Acta de Recepción de la Fiscalización.

## **12. FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA PARA LA FASE DOS, CON FINANCIAMIENTO**

Este contrato fue suscrito con ELECAUSTRO S.A. el 24 de julio de 2018, por un monto de US\$ 1'875.073,67.

El plazo es de 480 días, contados a partir del 01 de agosto de 2018, de los cuales 330 días corresponden a la Fase Dos A; en caso de no concretarse la suscripción de el o los convenios de crédito por parte de ELECAUSTRO S.A., de acuerdo a las ofertas de financiamiento presentadas por el Consorcio HIDRO CR para la

ejecución de la Fase Dos B, los tiempos asignados a la fiscalización para esta fase quedarán insubsistentes.

Aún no se suscribe el contrato de obra para la Fase Dos B.

**Estado:** En Ejecución

**Acciones a tomar:** No aplica.

## DISEÑOS

### 13. DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN “BALZAY”

Este contrato se suscribió con la Universidad de Cuenca el 27 de junio de 2014, por un monto US\$ 919.006,52.

El proyecto se encuentra suspendido desde el del 29 de mayo de 2016, fecha en la que se remitió el Oficio No. GER-GEN-134-2016, solicitando la suspensión del plazo contractual para la ejecución de los diseños y una ampliación de plazo para la entrega de la totalidad de los productos esperados. El levantamiento de la suspensión se daría una vez que se cuente con la aprobación del proyecto por parte de la I. Municipalidad de Cuenca.

En cuanto a la revisión y aprobación de Diseños, mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-306 de fecha 17 de agosto de 2018, remitido al Ing. Julver Pino, Decano de Ingeniería y Delegado del Rector en la Contratación de Obras Sector Balzay se solicitó la recepción parcial de los estudios (diseños arquitectónicos y de ingeniería de las vías y áreas exteriores del Campus Balzay), puesto que los mismos son parte de los productos previstos en dicho contrato.

El 7 de septiembre de 2018 se presentó el proyecto para el trámite de aprobación ante la Unidad de Control Municipal, y una vez que se cuente con la aprobación, se tomarán los 120 días autorizados para la entrega del Informe Definitivo. Se está revisando el diseño de las áreas exteriores.

Se encuentra pendiente la elaboración y trámite de la última planilla de pago tanto del Contrato Principal como del Contrato Complementario, las que se elaborarían una vez se termine la consultoría.

**Estado:** Suspendido.

**Acciones a tomar:**

- Dar seguimiento a la aprobación del proyecto por parte del Municipio.

### 14. DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS “IRQUIS”

Este contrato fue suscrito con la Universidad de Cuenca el 22 de abril de 2015, por un monto de US\$ 437.086,33.

Con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-183 del 03 de julio, se insistió en la solicitud de suspensión y ampliación de plazo expresadas en las comunicaciones No. GER-GEN-259-2016 del 16 de noviembre de 2016 y UCUENCA EP-GG-2017-075 del 23 de marzo de 2017, toda vez que a través de oficio No.



UCUENCA EP-GG-2017-106 del 21 de abril se remitió la información adicional que fuera solicitada por el Administrador del Contrato, Arq. Marcelo Vázquez, sin tener respuesta hasta la presente fecha.

Mediante comunicación remitida al señor Rector con Oficio No. UCUENCA EP-GG-2017-296 de fecha 20 de octubre de 2017, que contiene una recopilación de todos los temas que se encuentran pendientes en los diferentes proyectos que mantiene UCUENCA EP con la Universidad de Cuenca, se insistió sobre este particular, sin tener respuesta sobre la solicitud de suspensión y ampliación de plazo.

Se gestionó la aprobación del anteproyecto ante el GAD Municipal, la que fue objetada, en razón de que la propuesta presentada supera las condicionantes de ocupación del suelo para el sector, en virtud de lo cual se la Universidad de Cuenca debe tramitar ante el Alcalde y por su intermedio al Concejo Cantonal la revisión de esta condicionante.

Mediante oficio No. UCUENCA EP-GG-2019-022 del 18 de enero de 2019, dirigido al Administrador del Contrato, Arq. Patricio Hidalgo, se dio a conocer la razón por la cual el trámite de aprobación del anteproyecto se encuentra detenido y se invitó al Administrador y a funcionarios de la Universidad, para que asistan a una reunión coordinada con la Dirección de Planificación de la I. Municipalidad el 24 de enero, a fin de encontrar resoluciones que permitan avanzar con los trámites en esta institución.

**Planilla Pendiente:** se encuentra pendiente la elaboración y trámite de la última planilla de pago, la que se ejecutaría una vez se termine la consultoría.

**Estado:** Suspendido.

**Acciones a tomar:**

- Definir acciones a tomar, en función de lo tratado en la reunión del 24 de enero.

## **15. ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN, READECUACIÓN E INTERVENCIÓN PREDIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PASAJE ARTESANAL Y COMERCIAL SAN FRANCISCO**

Este contrato fue suscrito con el GAD Municipal del Cantón Cuenca el 20 de octubre de 2016, por un monto de US\$ 174,930.

Con fecha 22 de enero de 2018, se ha suscrito el Acta de Recepción y Aprobación Parcial correspondiente a la Primera Fase del Contrato de Régimen Especial No. RE-GADC-14014-16-OP.

Con fecha 6 de noviembre de 2018 se ha suscrito el Acta de Recepción y Aprobación Parcial correspondiente a la Segunda Fase del contrato.

Con fecha 16 de enero de 2019 se ha suscrito el Acta de Recepción y Aprobación Parcial correspondiente a la Tercera Fase del contrato.

El 16 de noviembre de 2018, se suscribió un Acta de Reforma al Cronograma de Ejecución del Contrato de Régimen Especial No. RE-GADC-14014-16-OP, para reprogramar la recepción y aprobación del Estudio Socioeconómico a ser entregado como parte de los productos correspondientes a la Tercera Fase

(Proyecto) hasta la Cuarta Fase de los estudios. Para ello se resolvió reprogramar y actualizar los productos contemplados en las Etapas III y IV de los estudios:

- III ETAPA: Una vez aprobado el anteproyecto, el Consultor elevará a proyecto arquitectónico el respectivo anteproyecto, considerando las modificaciones sugeridas en la Etapa anterior. Plazo 35 días contados a partir de la aprobación de la II Etapa. Se ha presentado el proyecto arquitectónico y se espera su aprobación.
- IV ETAPA: Una vez aprobado el Proyecto Arquitectónico, el consultor desarrollará los estudios complementarios, así como presentará el estudio socioeconómico, especificaciones técnicas para la construcción, presupuesto, desagregación tecnológica, programación de obra, regularización ambiental, plan de negocios requerido para la implementación del proyecto y la respectiva socialización del proyecto. Plazo 60 días contados a partir de la aprobación de la III Etapa.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:**

- Dar seguimiento a la aprobación del proyecto arquitectónico, correspondiente a la III Etapa.

**16. ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ**

Este contrato se suscribió el 13 de abril de 2016 con el GAD Municipal del Cantón Portoviejo, por un monto de US\$ 1'591.021,17.

Con fecha 5 de septiembre de 2017 se suscribió un contrato complementario, el que tuvo como fecha de vencimiento el 27 de enero de 2018.

En el mes de enero de 2018 se solicitó y aprobó una ampliación de plazo de 45 días, teniendo como fecha de terminación del proyecto el 13 de marzo de 2018. Se amplió nuevamente hasta el 31 de mayo, fecha en la que fue entregado el Borrador del Informe Final.

Se ha presentado el Informe Final Definitivo, se han recibido las observaciones del proyecto para la revisión respectiva. El Informe Final Corregido ha sido entregado el 14 de enero de 2019.

Se ha mantenido reuniones de trabajo con el Administrador del Contrato y los técnicos revisores, los que han emitido observaciones, a las que se están haciendo las aclaraciones y alcances que corresponden.

**Estado:** Concluido.

**Acciones a tomar:**

- Dar seguimiento a la aprobación del Informe Final Corregido.

**17. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN (4 CARRILES), RECTIFICACIÓN Y**

**MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PELILEO-BAÑOS, INCLUYE PUENTES Y PASO LATERAL DE PELILEO; LONGITU TOTAL APROXIMADA 34.00 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA**

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 7 de marzo de 2017, por un monto de US\$ 1'287.800,00.

Este proyecto se ejecuta en Consorcio con CONSULPROY, del cual el Ing. Gerardo Cordero actúa como Procurador Común.

El 8 de noviembre de 2017, se ha suscrito un contrato complementario, modificándose la tabla de cantidades, para la realización de pruebas de campo adicionales. Este contrato complementario no modifica el monto del contrato principal y considera un plazo adicional de 85 días, contados a partir de la fecha del cumplimiento del plazo del contrato principal.

Se ha suscrito un segundo contrato complementario el 12 de abril de 2018, en el que se contempla una ampliación de plazo de 120 días, contados a partir de la fecha del cumplimiento del plazo del Contrato Principal y Complementario No. 1, es decir desde el 15 de abril de 2018 hasta el 13 de agosto de 2018.

Se ha entregado el Informe Final Provisional, para la revisión correspondiente por parte de la contratante.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:**

- Dar seguimiento a la revisión del Informe Final Provisional.
- Dar seguimiento al Oficio PPB-SUP-002.19 de fecha 4 de enero de 2019, indicando que desde el mes de junio de 2018 se presenta la falta de pagos, solicitando se dé solución a la mayor brevedad.
- Una vez que las planillas sean pagadas, preparar la liquidación del contrato.

**18. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS Y LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE CARGOS POR COMPETENCIAS Y VALORACIÓN DE CARGOS DE EMAPAL EP**

Este contrato fue suscrito el 19 de septiembre de 2017 con la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del Cantón Azogues, por un monto de US\$ 17.652,80.

El Acta de Recepción fue suscrita el 5 de abril de 2018. Se cuenta con el pago total de los valores del contrato.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:** no aplica.

**19. ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL EMURPLAG EP – CUENCA**

Este contrato fue suscrito con la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado –EMURPLAG EP- el 21 de septiembre de 2017, por un monto de US\$ 163.000.

La consultoría contempla la entrega de productos de las tres fases de los estudios. Los informes de Fase I y Fase II han sido aprobados por el administrador.

Con Oficio Nro. EMURPLAGEP-ADM-CONT-UCUENCAEP-2018-0043-O del 10 de septiembre, el Administrador del Contrato notificó que se ha dado por aceptado el Informe Parcial de la Fase III.

Mediante oficio Nro. EMURPLAGEP-ADM-CONT-UCUENCAEP-2018-0046-O de fecha 20 de diciembre de 2018, se indica que una vez revisada la liquidación económica de la Consultoría propuesta por UCUENCA EP, se determina que el monto total a descontar del valor de contrato es de \$ 3.925,80 + IVA, por concepto de los productos no entregados.

Al momento se cuenta con la aprobación del estudio de impacto ambiental y está por entregarse el informe final (plazo ampliado hasta el 17 de febrero de 2019).

Se ha solicitado la terminación de mutuo acuerdo, en virtud de que no fue posible cumplir con el objeto del contrato, porque los estudios iniciales entregados por EMURPLAG EP no están completos y, por tanto, no pueden ser aprobados por las instancias correspondientes.

**Estado:** Concluido.

**Acciones a tomar:**

- Solicitar la terminación de mutuo acuerdo del contrato.

**20. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL TRAMO BIBLIÁN – ZHUD DE LA VÍA E35 DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, REALIZADO POR EL ECuateST EN EL AÑO 2014, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ENSAYOS IN SITU Y EN LABORATORIO, Y DETERMINACIÓN DE LAS POSIBLES CAUSADAS DEL DETERIORO PREMATURO DEL PAVIMENTO**

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección Distrital del Cañar, el 12 de diciembre de 2017, por un monto de US\$ 86.650,00.

Con fecha 22 de junio de 2018 se ha suscrito el Acta de Recepción Definitiva de este contrato.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Definitiva.

**Acciones a tomar:** No aplica.

**21. ESTUDIOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL COLEGIO NACIONAL “BENIGNO MALO” Y DISEÑO DE EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS**

Este contrato fue suscrito con la Coordinación de Educación Zonal 6, el 26 de diciembre de 2017, por un monto de US\$ 300.000,00.

Con Oficio No. UCUENCA EP-CBM-2018-122 del 3 de julio de 2018, se notificó al administrador del contrato la imposibilidad de ingresar la solicitud de línea de fábrica, puesto que la Institución mantiene una deuda exigible con el GAD Municipal del Cantón Cuenca por un monto de \$ 154.878,88.

Mediante Oficio No. UCUENCA EP-CBM-2018-124 de fecha 18 de julio de 2018, se solicitó la suspensión de plazo de la consultoría en su fase de anteproyecto, por encontrarse pendiente la obtención de la línea de fábrica del predio, solicitud que no fue posible ingresar por la deuda que mantiene la Institución con el GAD Municipal.

Se ha realizado el pago del valor adeudado al Municipio, por lo que se ha obtenido el certificado de afección y licencia urbanística, reanudándose el plazo. En este documento, el Municipio exige que se realice una prospección arqueológica que deberá ser aprobada por el INCP y que no estaba considerada ni en los términos de referencia ni en la oferta del estudio.

Una vez realizada la consulta al INCP, se ha indicado que la prospección se realice en la fase de construcción.

Se ha presentado el anteproyecto y ha sido aprobado.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:** No aplica.

## **22. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCOPE PARA EL PERIODO 2013-2017 Y SU IMPACTO**

Este contrato fue suscrito con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. el 7 de marzo de 2018, por un monto de US\$ 15.559,36.

Se ha suscrito el Acta de Entrega Recepción con fecha 15 de junio 2018.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Entrega Recepción.

**Acciones a tomar:** No aplica.

## **23. ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO**

Este contrato fue suscrito con el GAD Municipal de Zaruma, el 19 de marzo de 2019, por un monto de US\$ 148.239,28.

Mediante Oficio No. UCUENCA EP-PLAN-URB-ZAR-2018-029 de fecha 19 de diciembre, se entregó el Informe de la Fase 1: Diagnóstico, se han recibido las observaciones por parte del contratante.

Con Oficio No. UCUENCA EP-PLAN-URB-ZAR-2019-002 de fecha 22 de enero, se solicitó una ampliación de 15 días laborables para el plazo de entrega de los productos Propuesta y Modelo de Gestión, correspondientes a las fases II y III, respectivamente, así como la entrega de las observaciones emitidas por fiscalización sobre el documento de diagnóstico de la Fase I.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:** No aplica.

**24. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS Y LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE CARGOS POR COMPETENCIAS Y VALORACIÓN DE CARGOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL – EMAPAT EP**

Este contrato fue suscrito el 2 de mayo de 2018 con la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de La Troncal –EMAPAT EP-, por un monto de US\$ 15.047,37.

Se ha suscrito el Acta de Recepción Única el 3 de septiembre de 2018.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Única.

**Acciones a tomar:** No aplica.

**25. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYETO ARQUITECTÓNICO PARA EL EDIFICIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.**

Este contrato fue suscrito el 4 de mayo de 2018 con la Empresa Eléctrica Azogues C.A., por un monto de US\$ 27.668,57.

Se ha suscrito el Acta de Recepción Definitiva el 20 de julio de 2018.

**Estado:** Concluido. Con Acta de Recepción Única.

**Acciones a tomar:** No aplica.

**26. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA: PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA A CUENCA – ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE 14 KM. DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY**

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 29 de junio de 2018, por un monto de US\$ 2'586.696,00.

Inicialmente se suspendió el plazo de este estudio hasta que el Ministerio cancele el anticipo previsto.

Al momento, se ha concluido la Etapa Pre-preliminar y se cuenta con la aprobación respectiva. Se ha concluido con la Etapa Preliminar del proyecto, la que aún no ha sido aprobada por el MTOP.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:** No aplica.

**27. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS**

**CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES - BIBLIÁN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR**

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 29 de junio de 2018, por un monto de US\$ 1'512.664,45.

Inicialmente se suspendió el plazo de este estudio hasta que el Ministerio cancele el anticipo previsto.

Al momento, se ha concluido la fase de diagnóstico y prefactibilidad, y se está avanzando en el desarrollo del estudio de factibilidad, los diseños viales y geométricos, y los diseños estructurales.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:** No aplica.

**28. ELABORACIÓN DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA**

Este contrato fue suscrito el 10 de julio de 2018 con la Universidad de Cuenca, por un monto de US\$ 27.559,32.

El plazo total es de hasta 90 días, contados a partir de la entrega de los siguientes documentos a la empresa UCUENCA EP:

1. El Anteproyecto Arquitectónico aprobado por el Municipio de la ciudad de Cuenca; y,
2. La licencia urbanística.

Mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-444 de fecha 20 de noviembre, dirigido al Arq. Patricio Encalada, Administrador del Contrato, dado que no se ha recibido aún la documentación requerida para el inicio del proyecto, se solicita informar sobre el estado de dichos trámites.

Mediante Oficio No. UPFEO-ADERU-2018-003 de fecha 11 de enero, el Administrador del Contrato, Arq. Patricio Encalada indica que ya se cuenta con la aprobación del Municipio a los diseños arquitectónicos elaborados por la Universidad de Cuenca y la licencia urbanística. Así mismo convoca a la reunión de inicio según lo establecido en el numeral 3, literal a de la cláusula tercera del contrato para la entrega de los diseños arquitectónicos, la que se llevó a cabo el 14 de enero de 2019, fecha en la que iniciaría el plazo contractual.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:** No aplica

**29. DISEÑO DEL SISTEMA DE SEÑALÉTICA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA**

Se suscribió la orden de compra PO0113 el 20 de julio de 2018 con la Universidad de Cuenca, por un monto de US\$ 6.508,72.

Mediante Oficio No. UCUENCA EP-GG-2018-485 de fecha 14 de diciembre de 2018, se remitió en medio físico y digital un Informe Preliminar de los productos.

El plazo de ejecución del contrato es de 90 días calendario contados a partir de la entrega de la información por parte de la Universidad de Cuenca.

Mediante oficio No. UC-RC-2018-1580-O de fecha 6 de noviembre de 2018, se ha concedido una ampliación de plazo, hasta el 3 de diciembre de 2018.

Mediante oficio No. UC-URCP-2018-033-O de fecha 7 de diciembre de 2018, se concedió una nueva ampliación de plazo de 50 días, fijándose como nueva fecha de finalización de los trabajos el 22 de enero de 2019.

Mediante Oficio R. 2018 No. 1209 de fecha 21 de diciembre de 2018, el señor Rector autoriza la suspensión solicitada por el Administrador de la Orden de Compra.

**Estado:** Suspendido.

**Acciones a tomar:** No aplica

### **30. ESTUDIO DE CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL RECURSO COMPLEMENTARIO EÓLICO**

Este contrato fue suscrito con la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador –CELEC EP- el 18 de octubre de 2018, por un monto de US\$ 145.870,00.

Mediante Oficio No. RCE-DP-2018-001 de fecha 28 de noviembre de 2018, se ha entregado el Primer Producto “Informe de Identificación de Áreas de Potencial Eólico Complementario”, el mismo que ha sido aprobado mediante comunicación Nro. CELEC-EP0-2019-0110-OFI del 23 de enero de 2019.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:** No aplica

### **31. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO AL PUENTE COPUENO Y DE OTROS SITIOS CRÍTICOS SELECCIONADOS EN LA VÍA E45 -TRONCAL AMAZÓNICA-, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO**

Este contrato fue suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 31 de octubre de 2018, por un monto de US\$ 258.782,00.

En vista de que aún no se realiza el pago del anticipo, se ha solicitado la suspensión del contrato.

**Estado:** Suspendido.

**Acciones a tomar:** No aplica

### **32. ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REMODELACIÓN DE LA IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA**

Este contrato fue suscrito el 18 de diciembre de 2018 con la Universidad de Cuenca, por un monto de US\$ 18.807,45.



Según lo establecido en el contrato, con fecha 8 de enero, se entregó el anteproyecto arquitectónico al Municipio para su aprobación.

**Estado:** En ejecución.

**Acciones a tomar:** No aplica

### 33. ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE, A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y HUELLA DE CARBONO GENERADA POR DESPLAZAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE CUENCA

Este contrato fue suscrito con GIZ – Cooperación Técnica Alemana el 12 de diciembre de 2018, por un monto de US\$ 44.624,14.

Según lo establecido en el contrato, se ha presentado el primer producto y se ha emitido la factura correspondiente al primer pago.

**Estado:** En Ejecución.

**Acciones a tomar:** No aplica

## CUMPLIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN:

En las evaluaciones periódicas se establecen planes de acción, para los cuales se define un responsable y plazo de cumplimiento, con la finalidad de apoyar la gestión de los diferentes proyectos según lo programado. A diciembre del año 2018, se tienen los siguientes resultados en cuanto a la gestión de los planes de acción definidos:

### Planes de Acción definidos para las Fiscalizaciones

No. Planes de Acción	Estado	% de Cumplimiento
6	Cumplido	50%
1	No aplica (*)	8%
0	Dado de baja	0%
5	Pendiente	42%
0	En Ejecución	0%
0	Incumplido	0%
<b>12</b>	<b>Total</b>	<b>100%</b>

(\*) El estado "no aplica" corresponde a aquellos casos en los que no se requiere la definición de un plan de acción, puesto que el proyecto se está desarrollando según lo planificado.

Los temas pendientes son los siguientes:

- *Fiscalización de la Construcción de las Obras del Proyecto de Control de Inundaciones del Río Cañar*: se encuentra pendiente la respuesta que debe ser emitida por la Contraloría General del Estado, sobre el tratamiento que se dará a los gastos generales.
- *Fiscalización de la Construcción de las Obras del Proyecto de Control de Inundaciones del Río Naranjal*: se encuentra pendiente la respuesta de la Contraloría General del Estado, a las comunicaciones remitidas por el Consorcio, puesto que el reclamo se encuentra en fase de revisión administrativa de la Orden de Reintegro por parte de dicha institución.
- *Fiscalización de la Construcción de la carretera Gualaceo – Plan de Milagro, de 60.77 Km de longitud, ubicada en las provincias de Azuay y Morona Santiago*: se encuentra pendiente que la Contraloría General del Estado emita las predeterminaciones de responsabilidad, en base a lo cual se procedería al desvanecimiento de los hallazgos.
- *Fiscalización de la Reconstrucción de la Carretera Gualaceo – Limón, tramo: Gualaceo – Plan de Milagro, con 60.77 Km de longitud, ubicada en las provincias de Azuay y Morona Santiago; y diseños definitivos e ingeniería de detalle*: se encuentra pendiente la planilla de liquidación del contrato complementario 1.

#### Planes de Acción definidos para los Diseños / Estudios

No. Planes de Acción	Estado	% de Cumplimiento
4	Cumplido	22%
13	No aplica (*)	72%
1	Pendiente	6%
0	En Ejecución	0%
0	Incumplido	0%
<b>18</b>	<b>Total</b>	<b>100%</b>

(\*) El estado "no aplica" corresponde a aquellos casos en los que no se requiere la definición de un plan de acción, puesto que el proyecto se está desarrollando según lo planificado.

Los temas pendientes son:

- *Diseños Arquitectónicos y de Ingeniería para el Centro Científico, Tecnológico y de Investigación "Balzay"*: se encuentra pendiente definir la reanudación de la fecha del proyecto con el nuevo administrador del contrato designado, Arq. Patricio Hidalgo, que sería la fecha de aprobación del proyecto por parte de la I. Municipalidad de Cuenca.
